



**KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**



DENİZLİ İLİ BİLGİLERİ

28.07.2017



DENİZLİ İLİ YATIRIM DURUMU GÖSTERİR İCMAL DURUMU

1	YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü
2	SEKTÖRÜ	18 Ulaştırma
		1 Turizm
3	TOPLAM PROJE SAYISI	19
4	TOPLAM PROJE TUTARI	1,008 Milyar ₺
5	2016 SONU HARCAMA	315,556 Milyon ₺
6	TOPLAM ÖDENEK MİKTARI	75,606 Milyon ₺ (128 Milyon ₺)
7	DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	57,995 Milyon ₺
8	NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	77
9	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	37
10	BİTEN PROJE SAYISI	0
11	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	13
12	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	6

Ayrıca Denizli İlinde, Bakım, Trafik, Kamulaştırma çalışmaları ve diğer hizmetler için 6,3 Milyon TL. harcama yapılmıştır.





PROJE BEDELİ	1,008 Milyar ₺ (2017 yılı yatırım programından alınmıştır.)
2016 SONU HARCAMA	315,556 Milyon ₺
2017 YILI ÖDENEĞİ	75,606 Milyon ₺
2017 YILI HARCAMA	57,995 Milyon ₺ (Ayrıca; Bakım, Trf, Kamulaştırma vb. için 6,3 Milyon ₺ harcama yapılmıştır.)

DENİZLİ İLİ YOL AĞI	
DEVLET YOLU	428 Km
İL YOLU	396 Km
TOPLAM	824 Km


BY ve BSK DURUMU	
BÖLÜNÜMÜŞ YOL	383 Km
BSK'LI YOL	217,5 Km

2017 YILI		
	HEDEF	GERÇEKLEŞME
BY	11,2 Km	9,1 Km
BSK	37,6 Km	23 Km
TY	6 Km	7,8 Km
SK	229 Km	115 Km





DENİZLİ İL HARİTASI

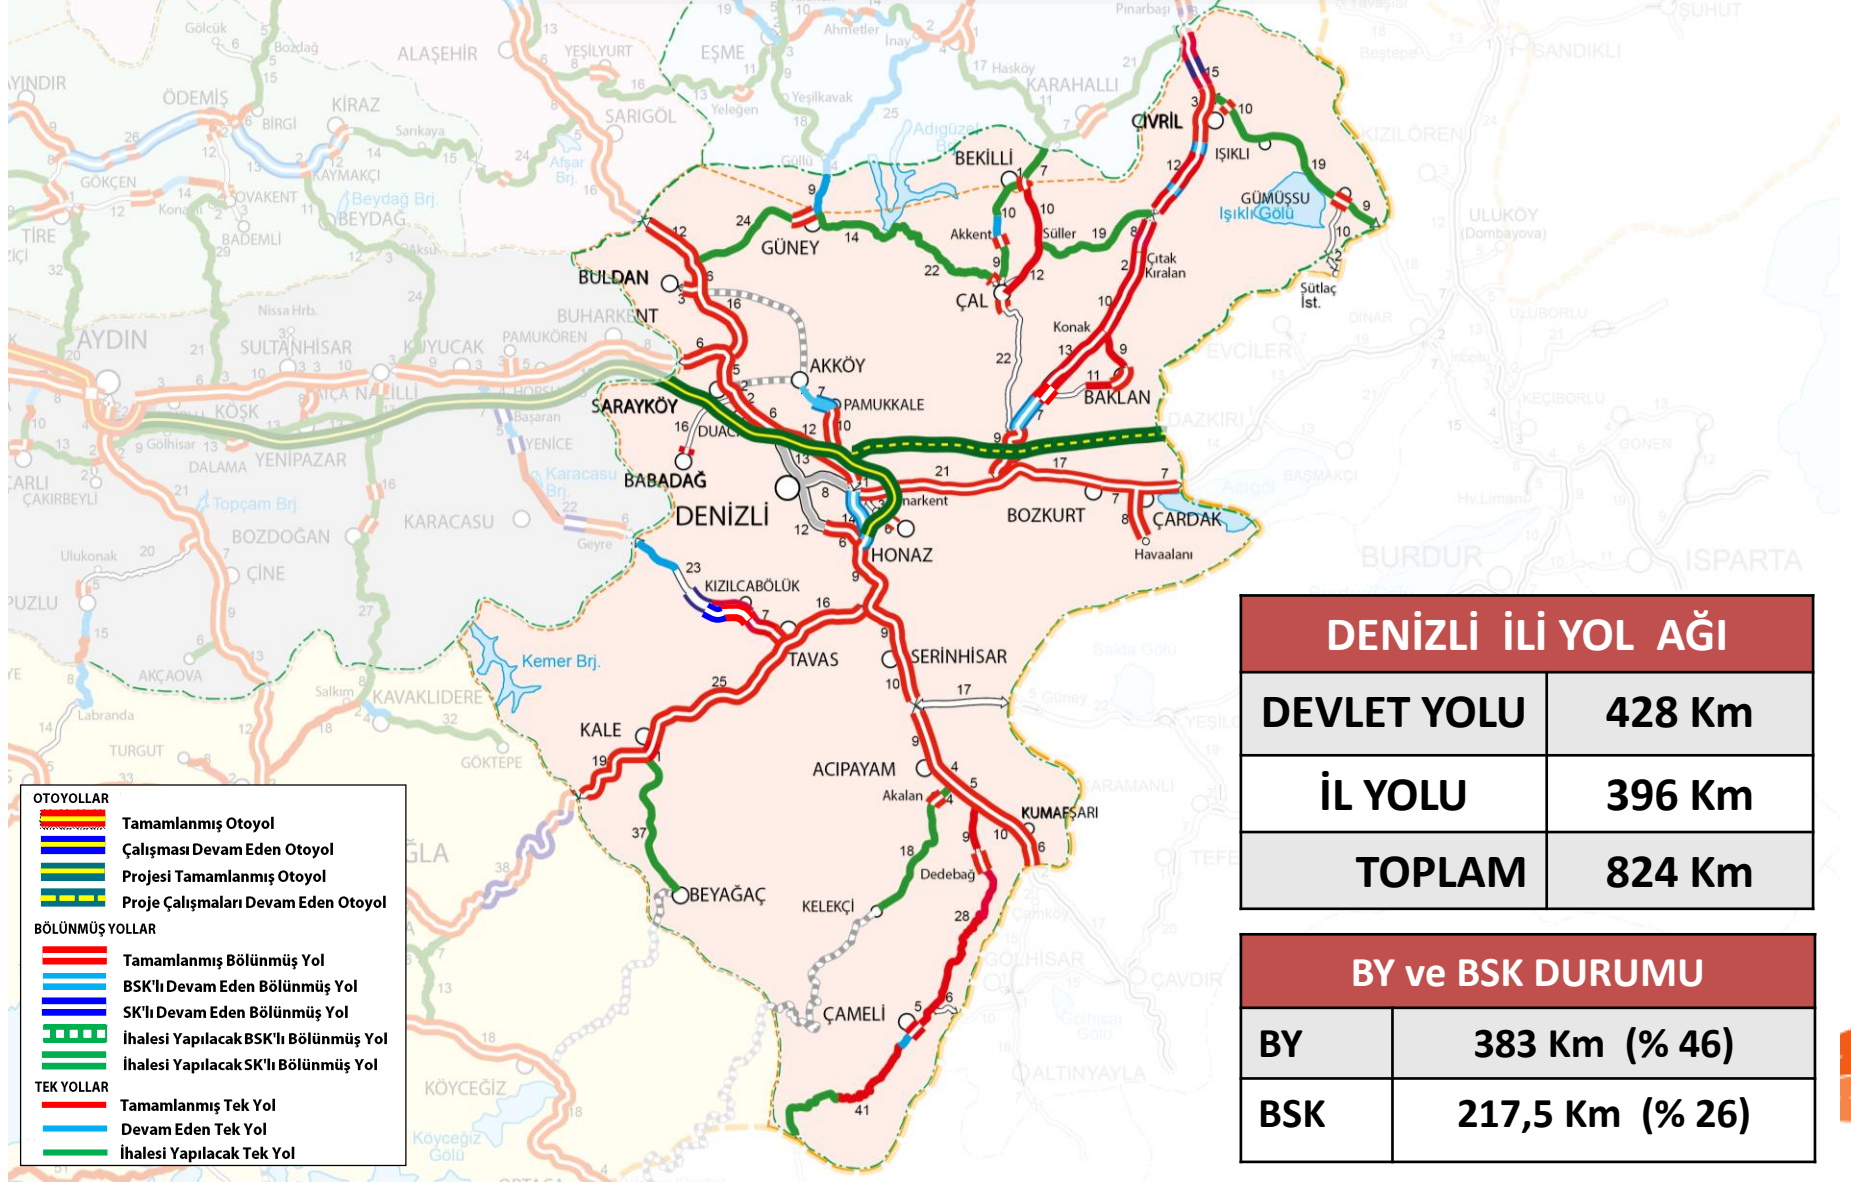

DENİZLİ İLİ YOL AĞI

DEVLET YOLU 428 Km

İL YOLU 396 Km

TOPLAM 824 Km

BY ve BSK DURUMU

BY 383 Km (% 46)

BSK 217,5 Km (% 26)

DENİZLİ İLİ PROJELERİ

**SALİHLİ-ALAŞEHİR-BULDAN-
(AYDIN-DENİZLİ)AYR. YOLU**

ULUBEY-GÜNEY YOLU

ÇAL-BEKİLLİ

**(NAZİLLİ-HORSUNLU) AYR.-
KARACASU-TAVAS**

**(DENİZLİ – ACIPAYAM AYRIMI)
– KALE – MUĞLA İL SINIRI**

**UŞAK-SİVASLI-ÇİVRİL
(DENİZLİ – ÇARDAK AYRIMI)**

ÇİVRİL ÇEVRE YOLU

**(DENİZLİ – UŞAK) AYR. –
ÇİVRİL-DİNAR**

**DENİZLİ-ÇARDAK Ayr.-
PAMUKKALE**

DENİZLİ - ÇARDAK

**DENİZLİ ÇEVREYOLU ve
DENİZLİ-ACIPAYAM-13. BL. HD.**

**(DENİZLİ – ANTALYA AYRIMI) –
ÇAMELİ – 13 BL. HD.**

İL SINIRI

ŞUBE SINIRI



1- DENİZLİ-ÇARDAK YOLU İKMAL İNŞAATI VE HAVAALANI YOLU:

- Denizli-Çardak-13. Bölge Yolu İkmal İnşaatı, Çardak Havaalanı ve Köprülü Kavşak Yapılması işi kapsamında,
- Bozkurt Geçişinde 3 km.lik kesim binder seviyesinde,
 - Denizli-Dinar Devlet Yolu güzergahında eksik kalan 5,5 km binder seviyesinde,
 - Çardak Havaalanı yolunun 7 km.si binder seviyesinde tamamlanmıştır.
 - Ayrıca Kaklık Farklı Seviyeli Kavşağın yapımı tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır.

2017 yılında ikmal ihalesi yapılacak olup, eksik kalan Çardak Havaalanı yolunun 1 km.lik kesimi SK>BSK, 1,5 km.lik Çardak Şehir geçişinde BSK onarımı, OSB Farklı Seviyeli Kavşağı, Kaklık Üstgeçit Köprüsü ve Havaalanı DDY Üstgeçit köprüsünün yapılması hedeflenmiştir.





KAKLIK FARKLI SEVİYELİ KAVŞAĞI






KARAYOLLARI
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1-DENİZLİ-ÇARDAK-13.BL.HD. (DENİZLİ-AFYONKARAHİSAR) YOLU:



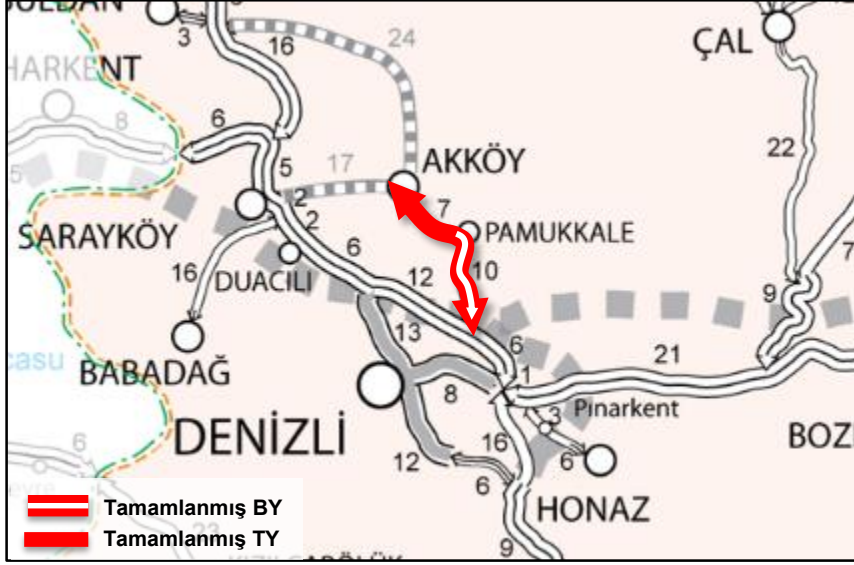


2. SARAYKÖY-AKKÖY-PAMUKKALE-(DENİZLİ-ÇARDAK)AYR.:

Toplam uzunluğu 34 km'dir. 10 km.lik kesim daha önceki yıllarda BY-BSK olarak tamamlanmıştır.

Pamukkale-Akköy arasında 4 km BY-BSK ve 2,2 km TY-BSK yapılması için 01.12.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanmıştır. Şantiye kurulumu ve kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

MÜTEAHHİDİ YAPIYOL İNŞ.



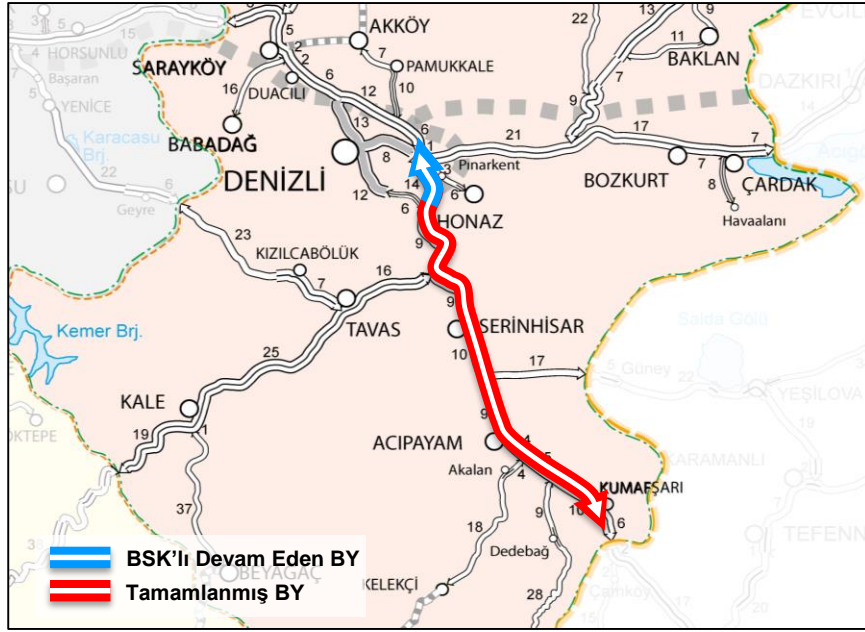

4. DENİZLİ-ACIPAYAM-13.BL.HD. (DENİZLİ-ANTALYA) YOLU:

Toplam uzunluğu 78 km olan yolun 2016 yılı sonu itibarı ile 62 km.si BY (28,3 km BSK, 33,7 km SK) olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

a)- Denizli Çevre Yolu 2. Kısım işinde;

Denizli Çevre Yolu, Honaz Tüneli işinin mevcut ihale ile tamamlanamaması sebebiyle 23.05.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış ve 11.07.2016 tarihinde işe başlanmıştır.

2.600 m Çift tüp tünelin, 54 m.si aç-kapa yapısı, 2.546 m.si ise tünelden oluşmaktadır. Aç-kapa yapısı dahil, Denizli tarafında giriş ağzı sağ tüpte 1.267 m, sol tüpte ise 1.188 m, çıkış ağzı sağ tüpte 204 m, sol tüpte 384 m tünel kazısı yapılarak toplamda 3.043 m'ye ulaşılmıştır.

2017 yılında 39,7 Milyon ₺ harcanmıştır.

MÜTEAHHİDİ Özce İnş ., Soner Temel Müh.+Yapıyol İnş.

b)-Denizli-Acipayam-13. Bölge Hd. Yolu Km:11+090-32+900 arası

Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve BSK işinin 20.07.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, sözleşmesi imzalanmış Etüt Proje ve Şantiye kurulumuna başlanmıştır.

MÜTEAHHİDİ: SİSTEM ELEKTRO MEKANİK

c)- Serinhisar-Acipayam-13.Bl.Hd. Yolu işinde;

Toplam uzunluğu 44,1 km olan yolun, 2016 yılı sonu itibarı ile 25,7 km.lik kesimi BSK'lı olarak tamamlanmıştır. BSK çalışmalarına devam edilmektedir.

2017 yılında 9 km SK>BSK tamamlanması hedeflenmiş olup, 8,1 Km.lik kesim SK>BSK olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında 2,4 Milyon ₺ harcanmıştır.

MÜTEAHHİDİ Özce İnş.+Özkar





DENİZLİ ÇEVRE YOLU HONAZ TÜNELİ



N

AYDIN
Çardak



Honaz Tüneli
2.600 m.

1.188 m.
1.267 m.

Sol Tüp Kalan : 1.028 m.
Sağ Tüp Kalan : 1.129 m.

384 m.

204 m.

MUĞLA -ANTALYA



(24.07.2017)

Sol Tüp Toplam İlerleme : 1.572 m.
Sağ Tüp Toplam İlerleme : 1.471 m. (% 59)



DENİZLİ ÇEVRE YOLU – HONAZ TÜNELİ






KARAYOLLARI
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

4-DENİZLİ-ACIPAYAM-13.BL.HD. (DENİZLİ-ANTALYA) YOLU



Cankurtaran Mevkii Girişi

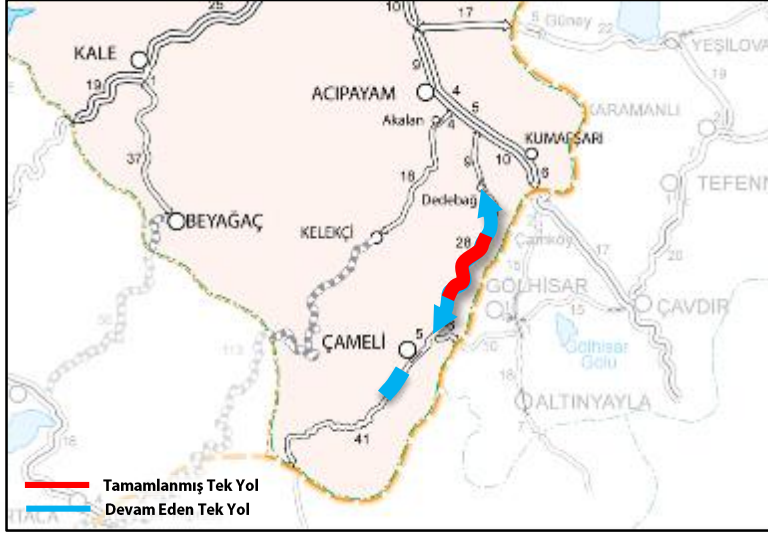

5. (ACIPAYAM-13.BL.HD.)AYR.-ÇAMELİ-13. Bl.Hd.:

a)- (Acipayam-13. Bölge Hududu)Ayr.-Çameli-13. Bölge Hududu yolunun 25,4 km olan kesiminin 2015 yılında ikmal ihalesi yapılmış olup, 2016 yılı sonu itibarı ile 13,3 km TY (4,3 km.si SK, 9 km BSK) olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında 6 Km TY-BSK tamamlanması hedeflenmiş olup, 6,3 km TY-BSK, 1,5 km TY-SK bitirilmiştir.

2017 yılında 4,5 Milyon ₺ harcanmıştır.

b)- Çameli-13. Bölge Hududu arası ihale edilmeyen 17 km.lik kesimin projesi tamamlanarak kontrolü yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde proje çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmiştir. Zemin araştırma çalışmaları tamamlanmıştır.

MÜTEAHHİDİ; TEYDA İNŞ.





5. (ACIPAYAM-13.BL.HD.)AYR.-ÇAMELİ-13. BL.Hd.:






5. (ACIPAYAM-13.BL.HD.)AYR.-ÇAMELİ-13. BL.Hd.:





KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

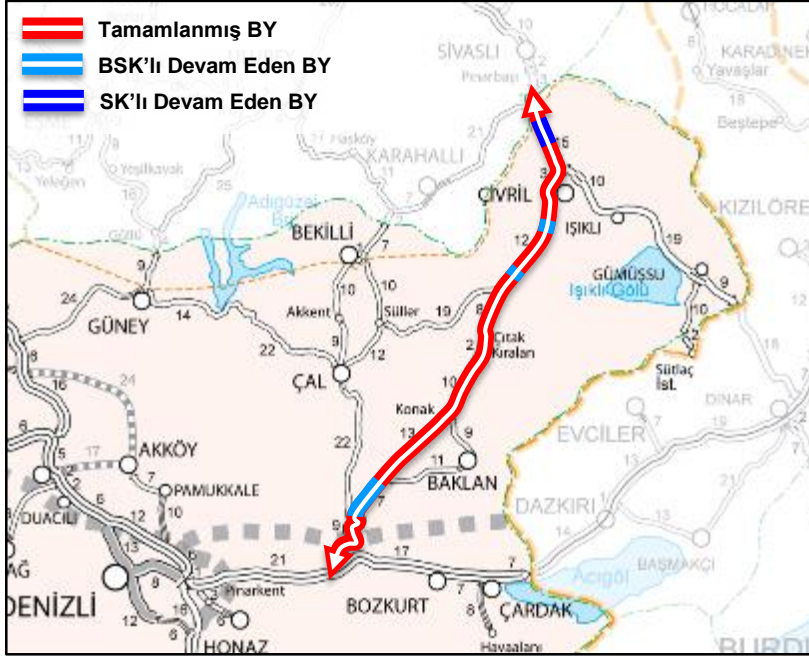

6. (DENİZLİ-ÇARDAK) AYR.-SİVASLI-UŞAK:

Toplam uzunluğu 118 km olan yolun 2015 yılı sonu itibarı ile 102,7 km.si (49,6 km BSK, 53,1 km SK) bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Yolun Denizli ili sınırları içerisinde kalan 80 km.lik kesiminin 68,3 km.si (49,6 km BSK, 18,7 km SK) bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında; 8,1 km BY-BSK, 4,5 km SK üzeri BSK yapımı hedeflenmiş olup, 8,1 Km BY-BSK tamamlanmıştır.

2017 yılında 6,4 Milyon ₺ harcanmıştır.

MÜTEAHHİDİ; Özce-Fermak-Çiftay, EZK İnş.

Uşak-Sivaslı-(Denizli-Çardak)Ayr. Yolu Km 0+000-56+416 Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK işlerinin ihalesi 12.01.2017 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır.


MÜTEAHHİDİ; YAZICIOĞLU





6. (DENİZLİ-ÇARDAK) AYR.-SİVASLI-UŞAK:



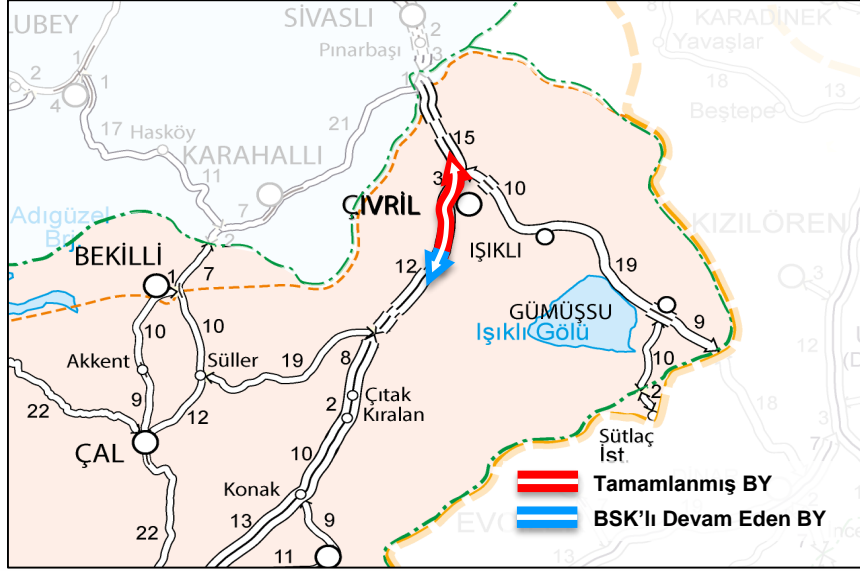

7. ÇIVRİL ÇEVRE YOLU:

Toplam uzunluğu 8 km olan yolun 2014 yılı sonu itibarı ile tamamı BY-SK olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

28.09.2015 tarihinde Çivril Çevre Yolu Km: 0+000-7+940 arası Çivril Giriş Kavşağı ve bağlantı yolları dahil, toprak tesviye, sanat yapıları, Üstyapı ve BSK işi ihale edilmiş tir. Toprak tesviye, sanat yapıları ve üstyapıda çalışmalara devam edilmektedir.

2017 yılında 4 Km SK üzeri BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.

2017 yılında 2,6 Milyon ₺ harcanmıştır.

MÜTEAHHİDİ; DMR İnş





8. (DENİZLİ-ACIPAYAM) AYR.-KALE-MUĞLA:

Toplam uzunluğu 61 km'dir. 2016 sonu itibarı ile yolun tamamı sathi kaplamalı bölünmüş yol ve Tavas Farklı Seviyeli Kavşağı tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Bu güzergahta Denizli il sınırı-Kale arasında (Km:55+000-72+500) bulunan muhtelif kesimlerdeki heyelanlı bölgelerin ıslahı işi 14.03.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, 09.06.2016 tarihinde işe başlanmıştır. Toprak işi ve sanat yapıları çalışmaları devam etmektedir.

2017 yılında 2,5 Milyon ₺ harcanmıştır.


MÜTEAHHİDİ; Alkan İnş.

41 km uzunluğunda olan (Denizli-Acıpayam)Ayr.-Tavas-Kale arasının BSK kaplamalı hale getirilmesi işi Genel Müdürlüğümüzce 17.01.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanmıştır.

2017 yılında 3 Km.lik kesimin SK üzeri BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.

MÜTEAHHİDİ; FEZA İnş.,



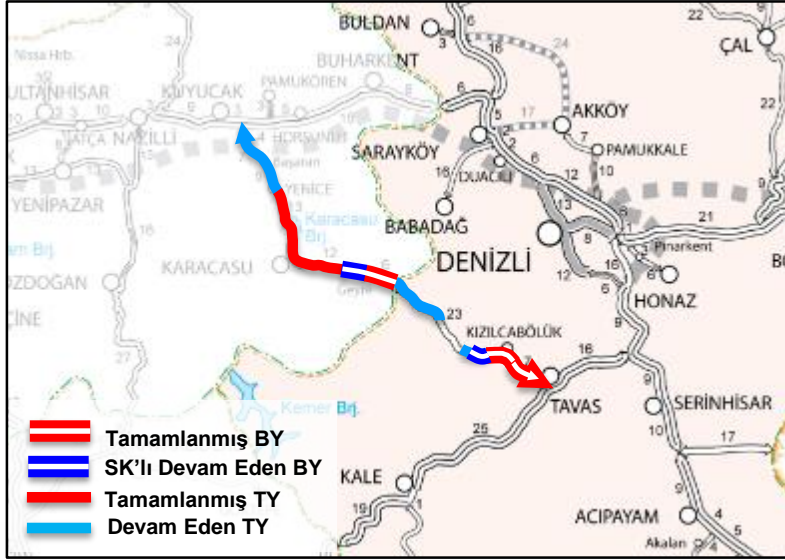

9. (NAZILLI-HORSUNLU) AYR.-KARACASU-TAVAS:

Toplam uzunluğu 70 km olan yolun 2016 yılı sonu itibarı ile 47,4 km si (19,5 km BY-SK, 1,7 km BY-BSK, 26,2 km TY) tamamlanmıştır.

Denizli ili sınırları içerisindeki uzunluğu 30 km olan projenin 11,3 km BY-SK, 1,7 km.si BY-BSK olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında 3,1 km BY-SK yapılması hedeflenmiştir. 1 km.lik kesimi BY-SK olarak bitirildi.

MÜTEAHHİDİ Recep Şanlı+Otoyol





KARAYOLLARI
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

9-(NAZİLLİ-HORSUNLU) AYR.-KARACASU-TAVAS:





10- ÇAL-BEKİLLİ YOLU:

Çal-Bekilli Yolu (Alfaklar, Hançalar, Akkent Geçişleri) 4 Km.lik kesimde Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşinin 2011 yılında ihalesi yapılmıştır.

Akkent ve Hancalar geçişinde kamulaştırma problemlerinin çözülmesi halinde toprak tesviye, sanat yapıları ve üstyapıda çalışılacaktır.

MÜTEAHHİDİ Makyar İnş.






11. ULUBEY-GÜNEY YOLU:

Toplam uzunluğu 38 Km olan yolun Denizli ilindeki uzunluğu 9 km.dir. Yolun 25.02.2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

Ancak müteahhitten kaynaklanan problemlerden dolayı iş fesh edilmiştir. 2017 yılı içinde yeniden ihale edilmesi planlanmaktadır.

MÜTEAHHİDİ: FDN-Koray O.G.




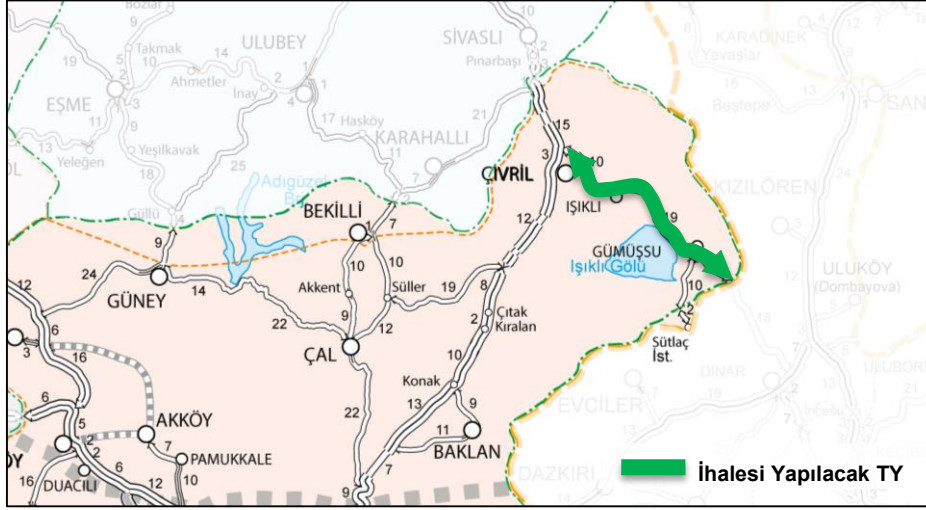

12. (DENİZLİ – UŞAK) AYR. – ÇİVRİL-DİNAR YOLU:

Toplam uzunluğu 37,6 Km olan yol TY- BSK olarak ihale edilecek olup, keşif çalışmaları devam etmektedir.



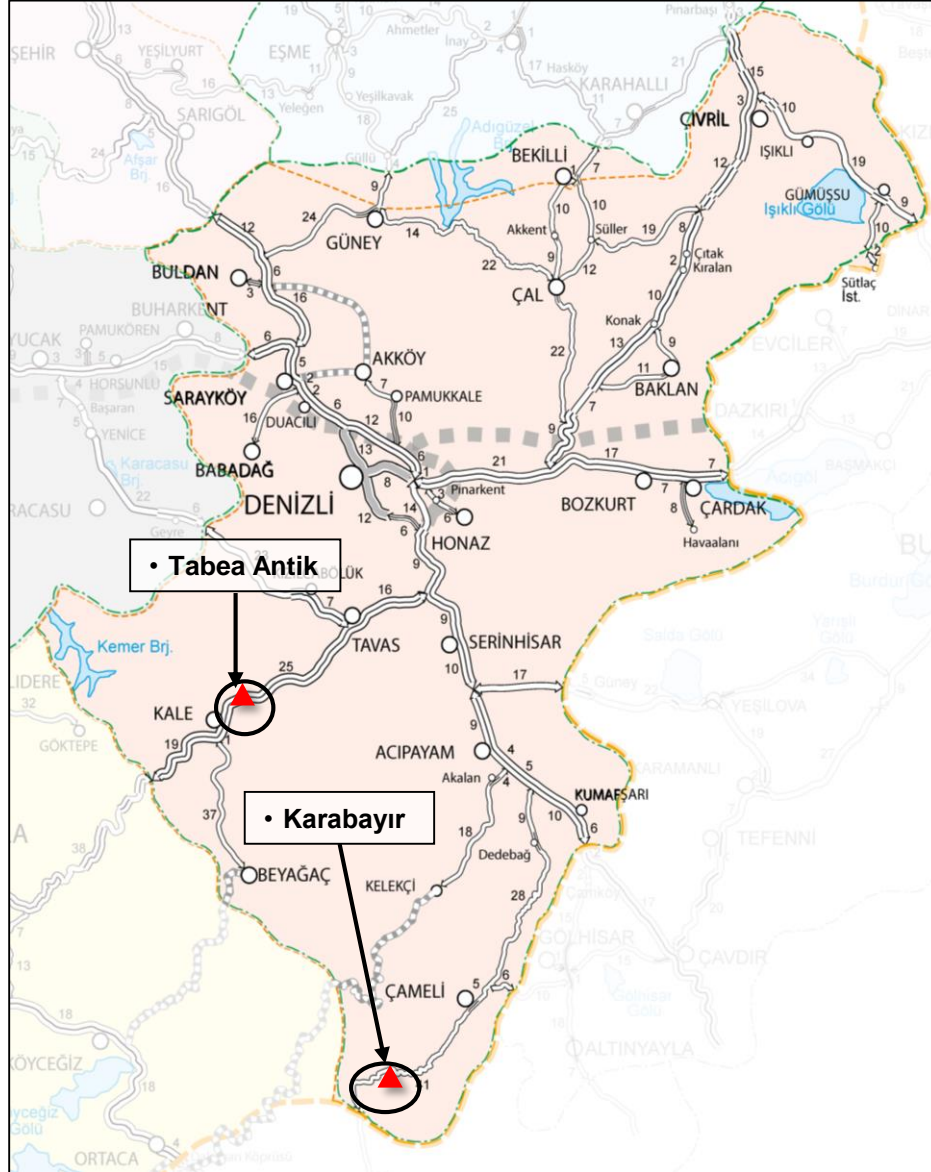

**12. ACIPAYAM-ÇAMELİ-FETHİYE YOLUNDA;
KARABAYIR KÖPRÜSÜ:**

(Denizli- Acipayam)Ayr.- Çameli- 13.BI.Hd. Yolunun kalan 17 Km.lik kesiminin ihalesi bünyesinde yapılacaktır.

13. TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI


Kale ilçesinde Tabea Antik Kenti girişindeki taş köprü'nün projeleri hazırlanmış olup, 2017 yılında onarım ve restorasyon ihalesinin yapılması planlanmaktadır.



*Tabea Antik Kenti Girişi
Tarihi Taş Köprü*




İZMİR – ANTALYA OTOYOLU

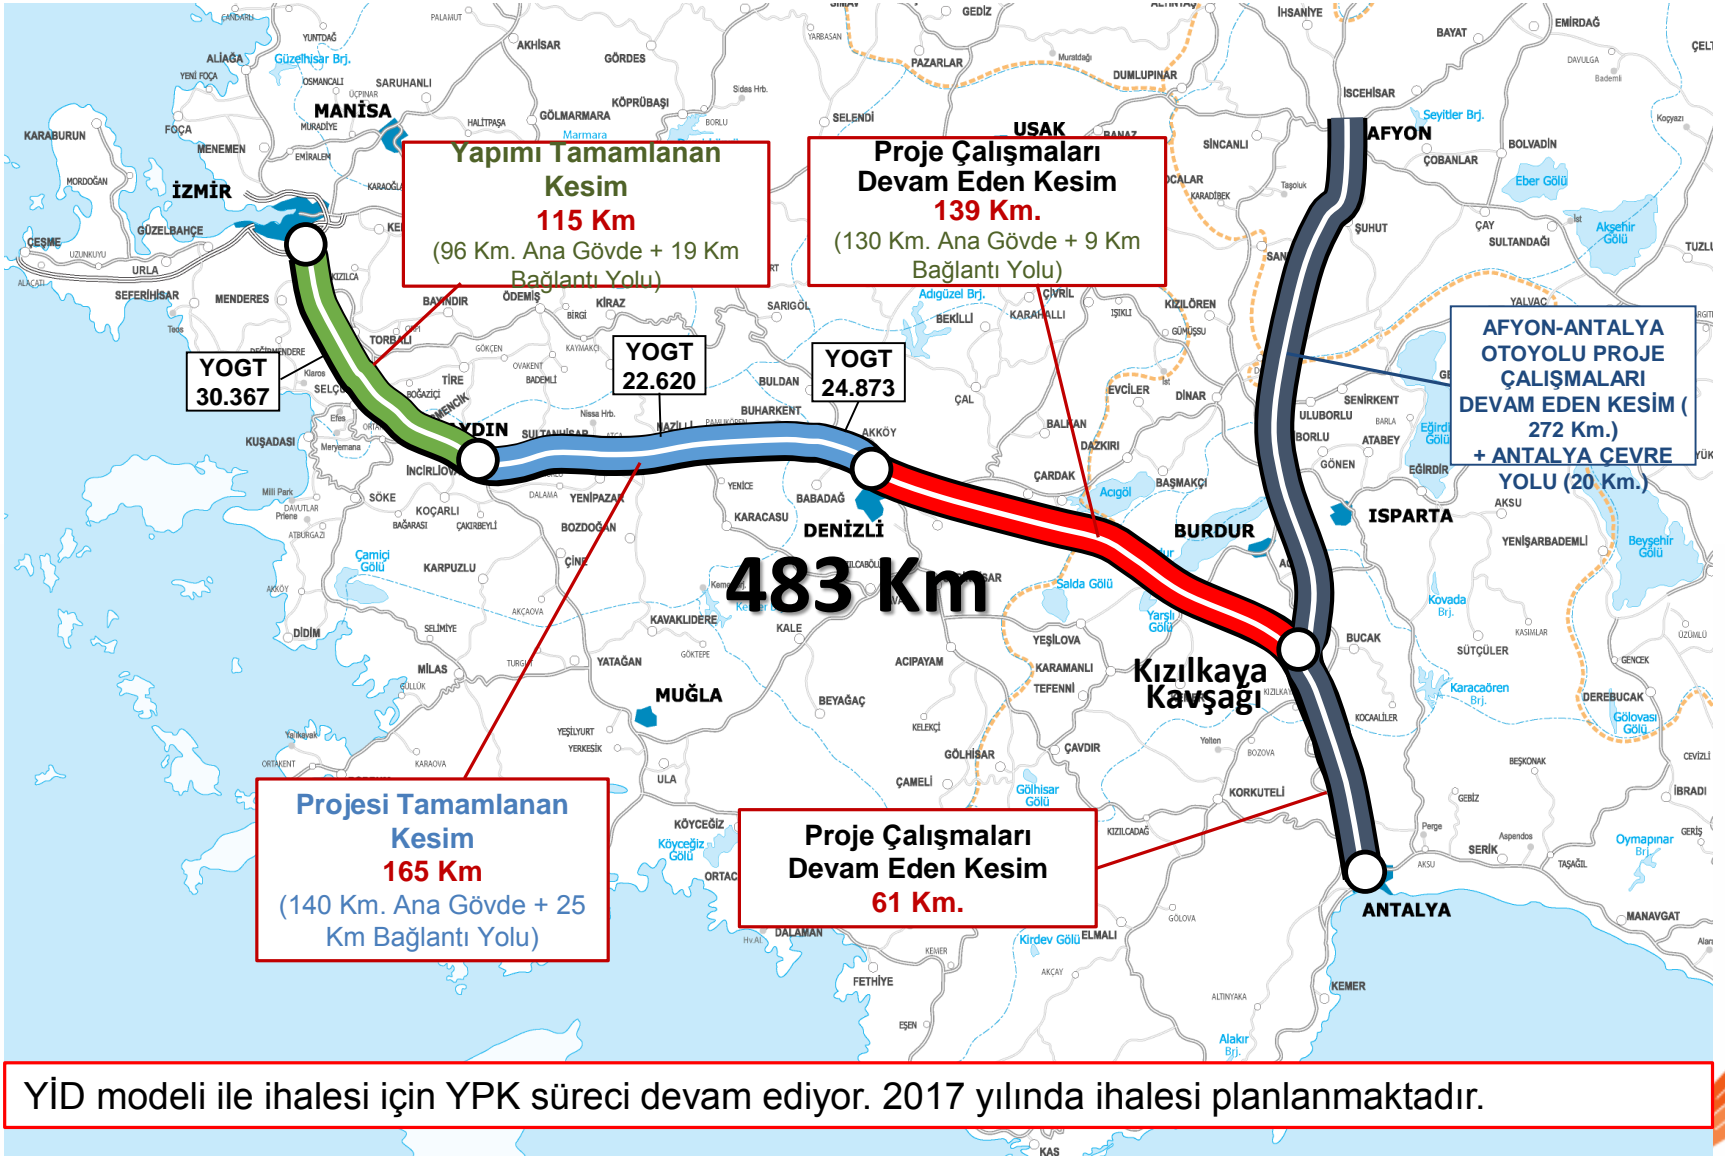

YİD modeli ile ihalesi için YPK süreci devam ediyor. 2017 yılında ihalesi planlanmaktadır.



İZMİR - İSTANBUL OTOYOLU (YİD)

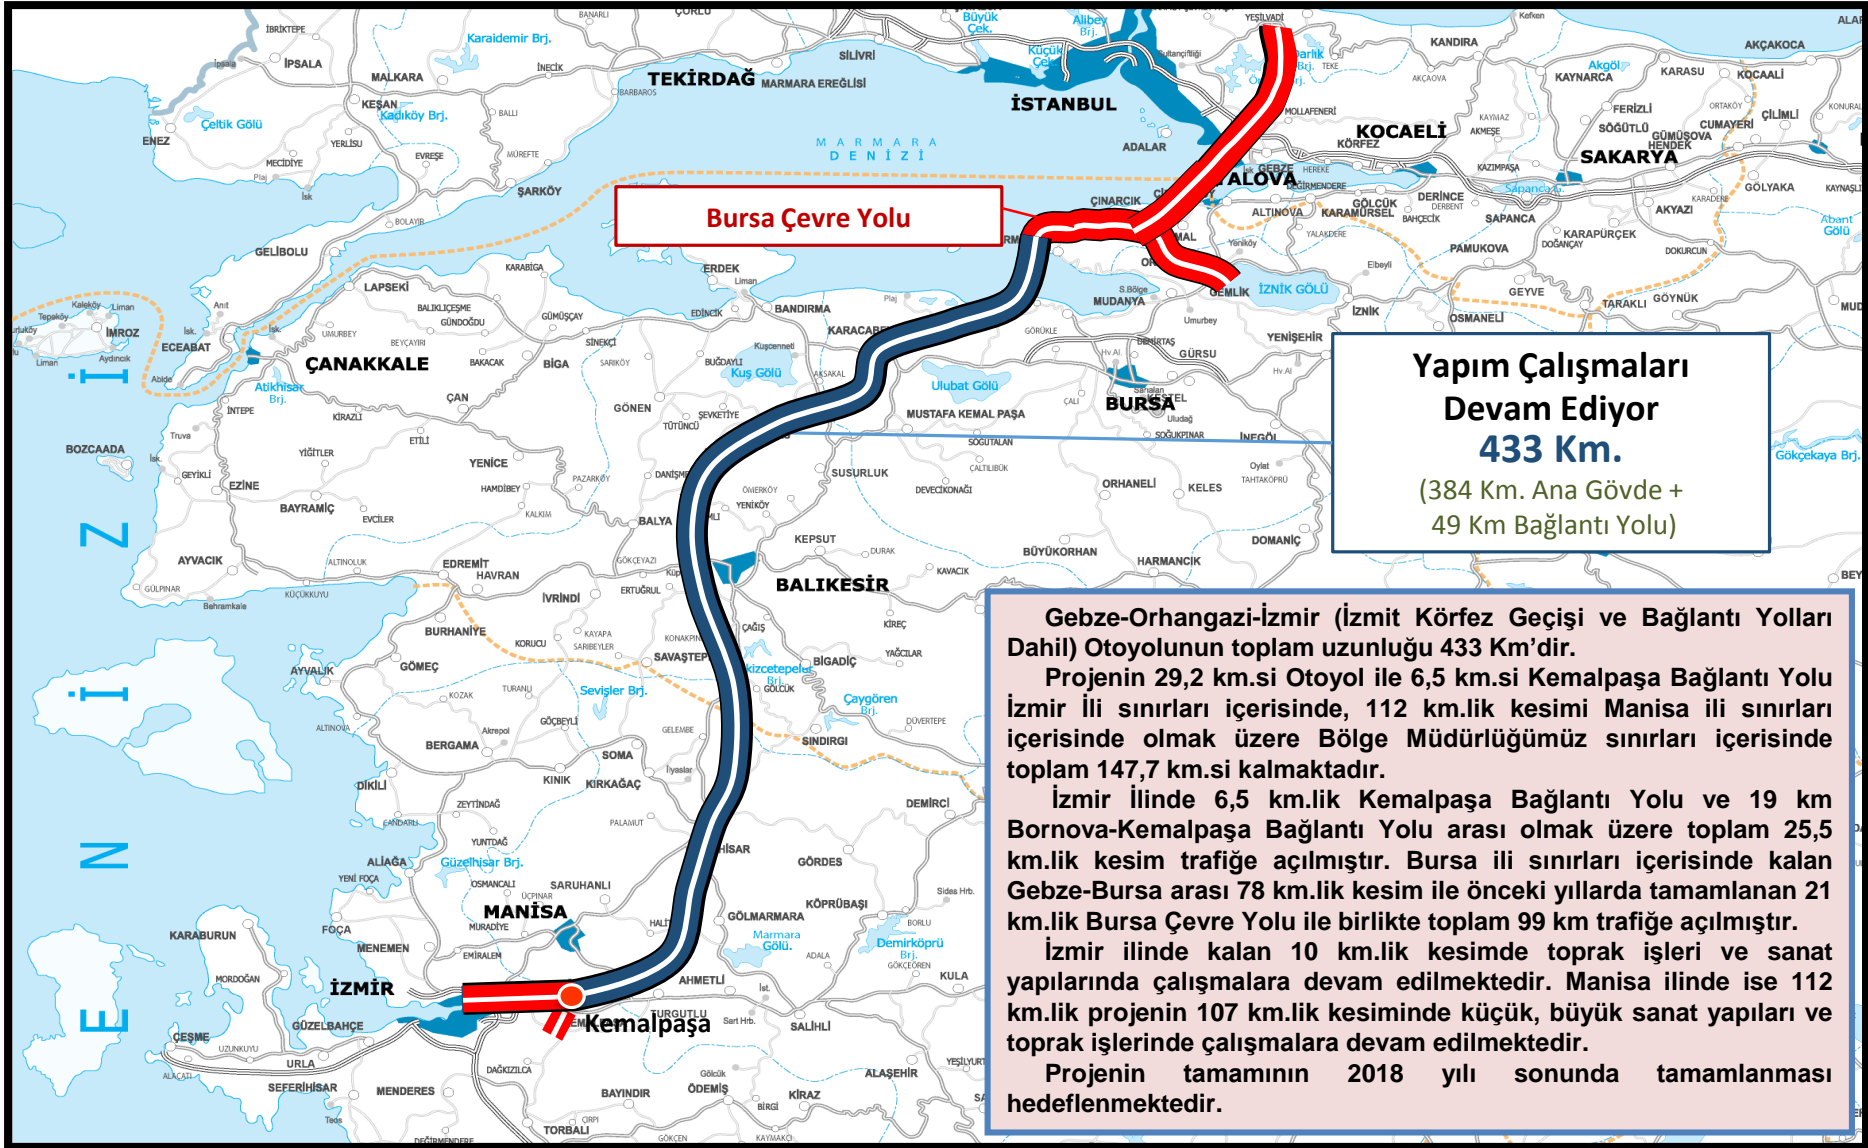

Bursa Çevre Yolu

**Yapım Çalışmaları
Devam Ediyor
433 Km.**
(384 Km. Ana Gövde +
49 Km Bağlantı Yolu)

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfezi Geçisi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolunun toplam uzunluğu 433 Km'dir. Projenin 29,2 km.si Otoyol ile 6,5 km.si Kemalpaşa Bağlantı Yolu İzmir İli sınırları içerisinde, 112 km.lik kesimi Manisa ili sınırları içerisinde olmak üzere Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde toplam 147,7 km.si kalmaktadır. İzmir ilinde 6,5 km.lik Kemalpaşa Bağlantı Yolu ve 19 km Bornova-Kemalpaşa Bağlantı Yolu arası olmak üzere toplam 25,5 km.lik kesim trafiğe açılmıştır. Bursa ili sınırları içerisinde kalan Gebze-Bursa arası 78 km.lik kesim ile önceki yıllarda tamamlanan 21 km.lik Bursa Çevre Yolu ile birlikte toplam 99 km trafiğe açılmıştır. İzmir ilinde kalan 10 km.lik kesimde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalara devam edilmektedir. Manisa ilinde ise 112 km.lik projenin 107 km.lik kesiminde küçük, büyük sanat yapıları ve toprak işlerinde çalışmalara devam edilmektedir. Projenin tamamının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.



KARAYOLLARI
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ





**KARAYOLLARI
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**





2017 Yılında ayrıca;

- Yol Bakım Hizmetleri için : 1,9 Milyon ₺
- Kamulaştırma ve Diğer : 2 Milyon ₺
harcanmıştır.

Trafik Güvenliği hizmetleri için ;

2,4 Milyon ₺ harcama yapılmış olup;

- 170 185 m² yatay işaretleme
- 721 m² düşey işaretleme
- 20.049 m² yapılmıştır.






YAYA ÜSTGEÇİDİ

Denizli 2017 yılında ise 1 adet yaya üstgeçidi yapılması hedeflenmiştir.


YOLUN ADI	AÇIKLAMA
Denizli-Çardak Yolu	Kaklık Kavşağı

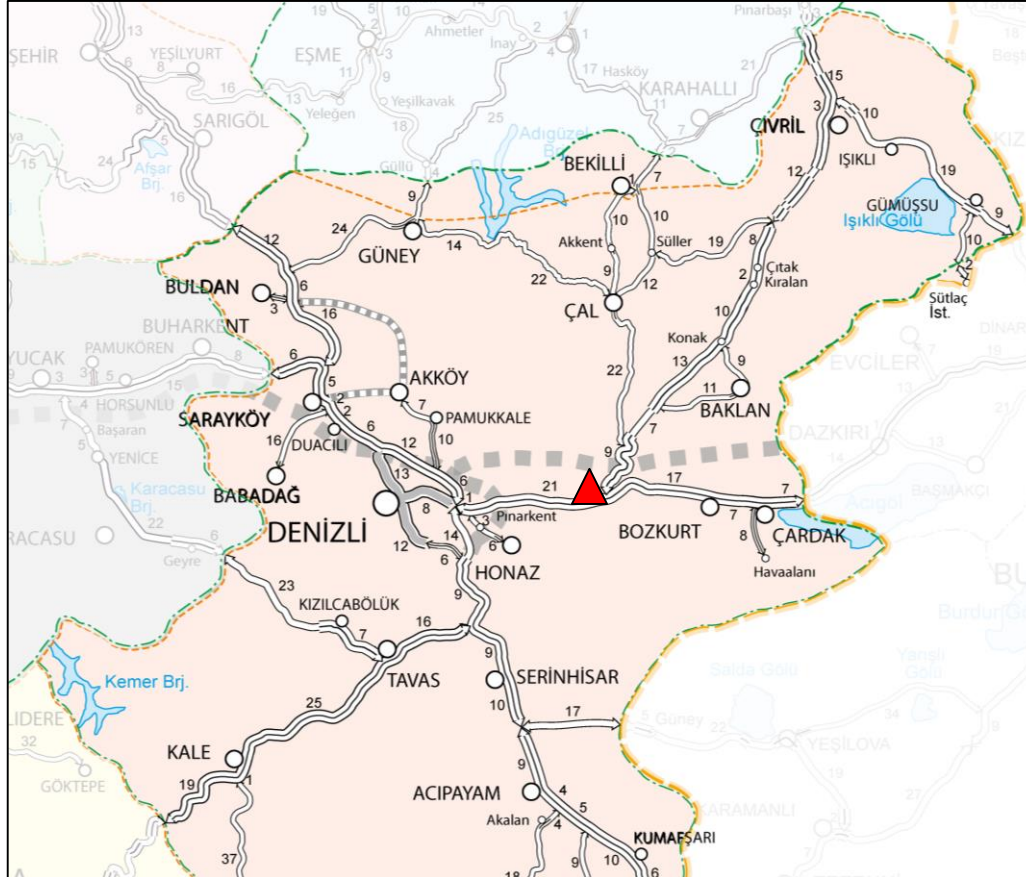



SİNYALİZASYON

Denizli İlinde 2017 yılında 3 adet sinyalizasyon sistemi yapılması hedeflenmiştir.

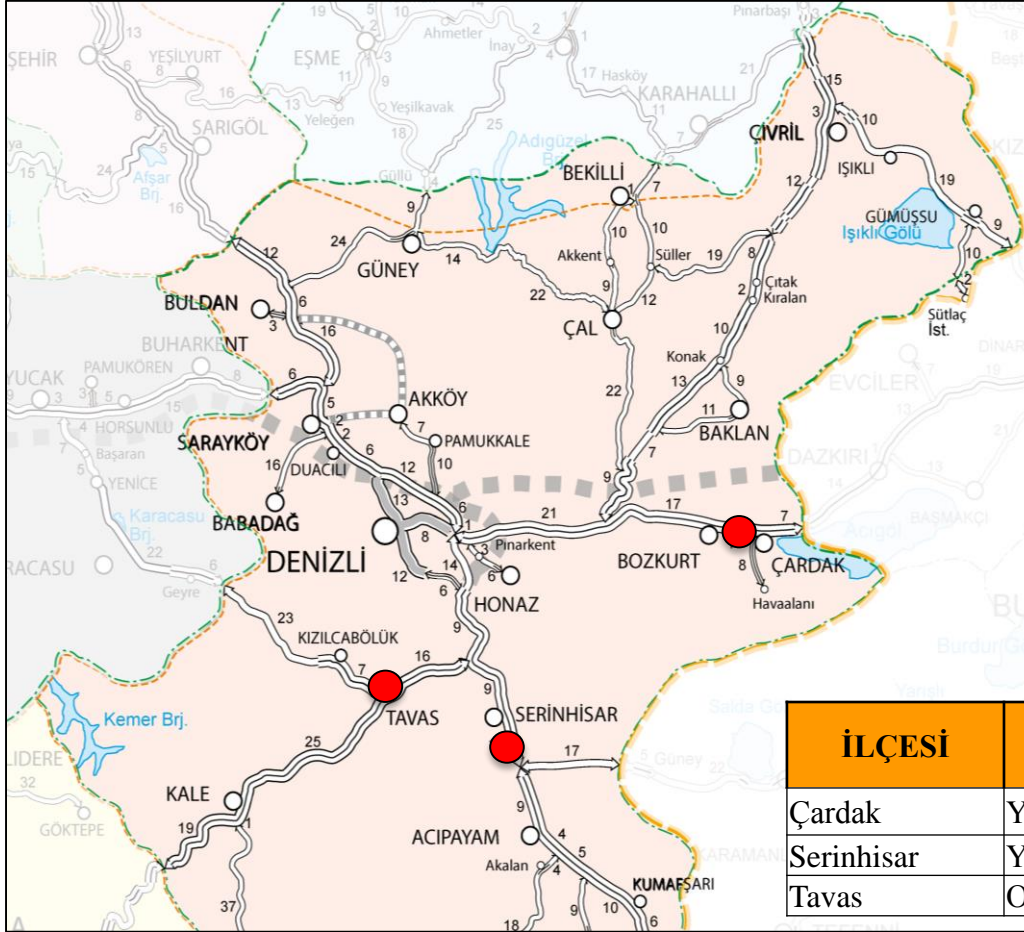


İLÇESİ	KAVŞAK ADI	AÇIKLAMA
Çardak	Yaya Butonlu Kavşak	Yeni Tesis
Serinhisar	Yeşilova Ayrımı Kavşağı	Yeni Tesis
Tavas	Okul Önü Yaya Butonu	Yeni Tesis



KARAYOLLARI
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI SK ÇALIŞMALARI

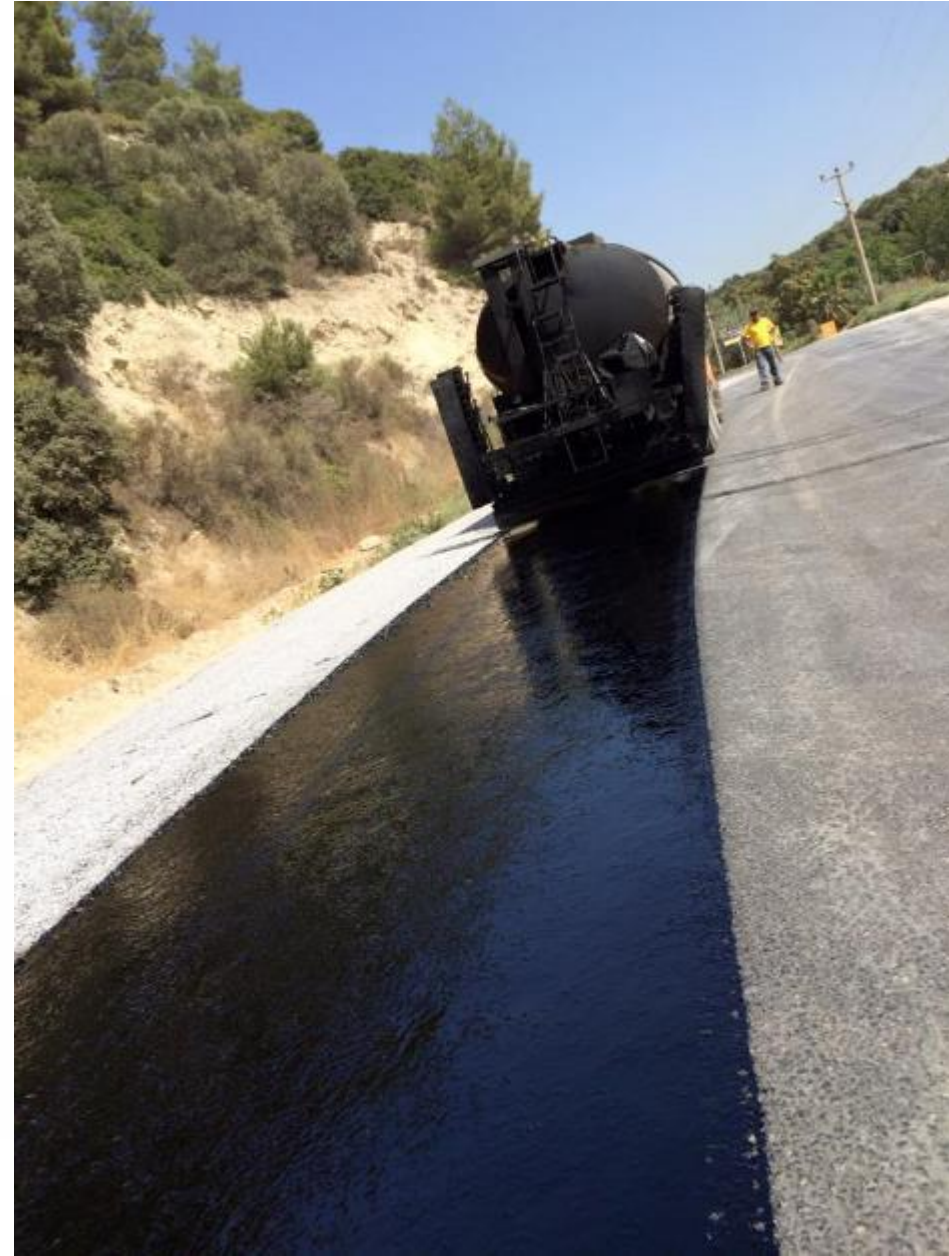

2017 YILI YAPILAN

Ko (Km)	K (Km)	TOPLAM (Km)
4	111	115



KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




Arz Ederim .



Abdulkadir URALOĞLU
Bölge Müdürü



DENİZLİ İLİ PROJE BİLGİLERİ

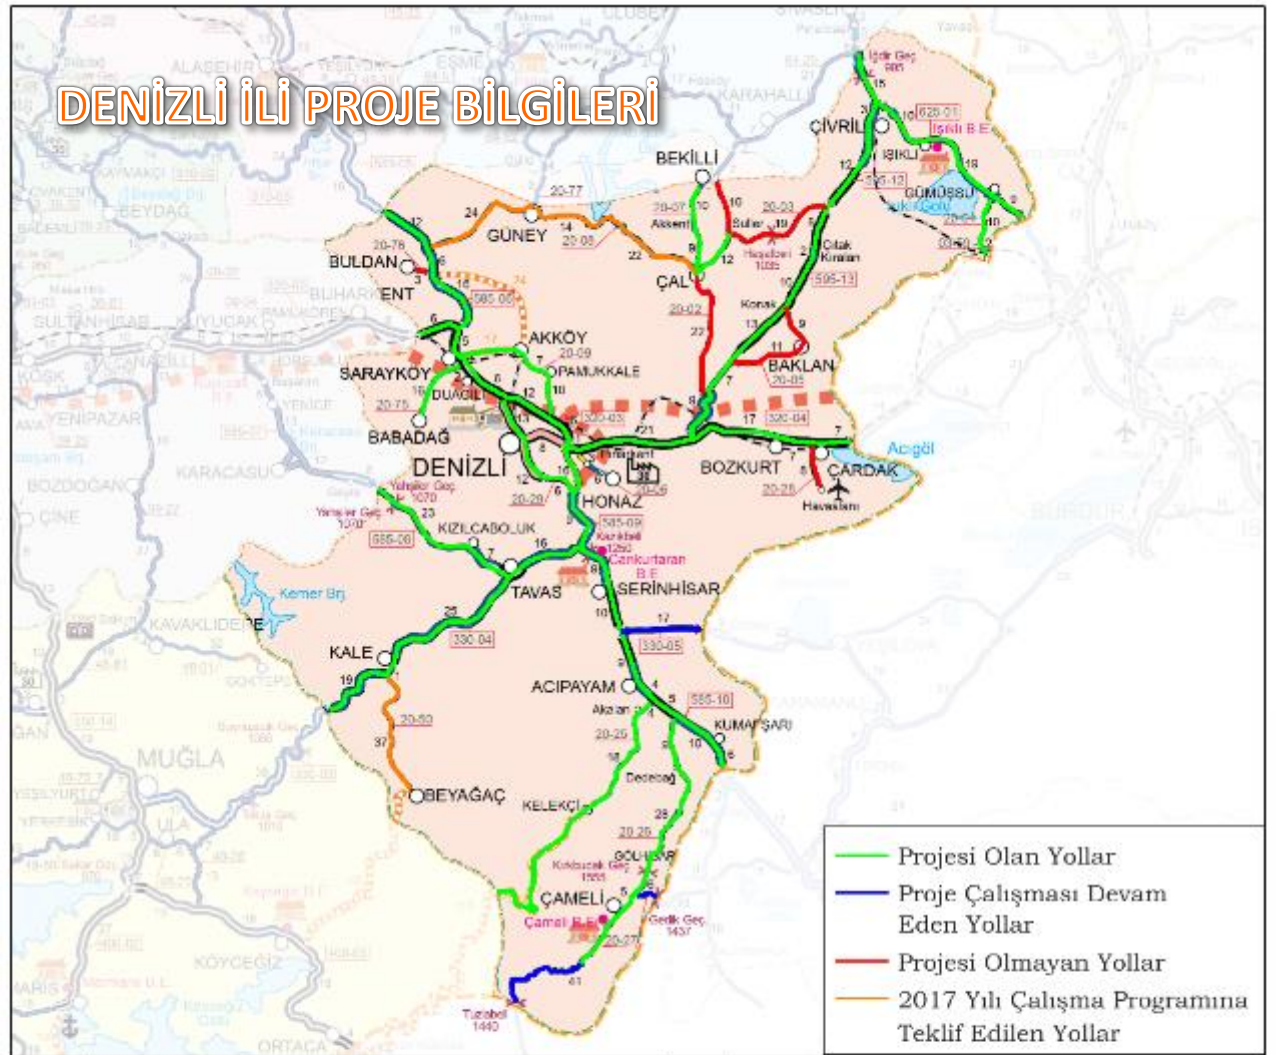

- Projesi Olan Yollar
- Proje Çalışması Devam Eden Yollar
- Projesi Olmayan Yollar
- 2017 Yılı Çalışma Programına Teklif Edilen Yollar

SIRA NO	YOLUN ADI	KM	PRJ. DURUMU
1	Çameli - 13 Bl. Hud. Yolu	24	Proje Çalışmaları İhaleli Olarak Devam Etmekte
2	(Serinhisar - Cavdır) Ayr. - Yeşilova Yolu	16	Proje Çalışmaları İhaleli Olarak Devam Etmekte
3	Kale - Beyağaç İl Yolu	37	2017 Yılı İçinde Proje Çalışmalarına Başlanacak
4	Çal-Güney-(Alaşehir- Buldan) Ayr.	60	2017 Yılı İçinde Proje Çalışmalarına Başlanacak
Not: Projesi 1A standartında (12 m) BSK ve SK olarak projelendirilecektir.			

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	PROJE DURUMU	DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR	
									NAKİT HARCAMA	%GERÇEKLEŞME NAKDİ	FİZİKİ		
			DEVLET YOLLARI YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI										
1	Ulaştırma	1994E040970	Denizli-Çardak-13.Bl.Hd.	Denizli	200.297	153.719	2.570	Dev.	0	0	77	Denizli- Çardak yolu BY-BSK ve Çardak Havaalanı yolununun 7 km.si BY -BSK olarak tamamlanmıştır.2017 yılında ikmal yapılarak köprülü kavşak ve üstgeçitlerde çalışılacaktır.	
			BÖLÜNMÜŞ YOLLAR										
2	Ulaştırma	1977E040390	Denizli-Acıpayam-13.Bölge Hududu	Denizli	204.511	81.772	42.065	Dev.	42.065	100	61	2017 yılında 9 Km.lik kesimin SK > BSK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 3,1 Km.lik kesim SK>BSK olarak tamamlanmıştır.	
3	Ulaştırma	2010E040210	(Denizli-Çardak)Ayr.-Sivasi-Uşak	Denizli-Uşak	140.244	6.330	6.392	Dev.	6.392	100	9	2017 yılında 8,1 Km BY-BSK ve 4,5 Km SK üzeri BSK tamamlanması hedeflenmiş olup, 8,1 km BY-BSK tamamlanmıştır.	
4	Ulaştırma	2006E040440	(Denizli-Acıpayam)Ayr.-Kale-Muğla İl Sn.	Denizli	160.670	9.458	3.328	Dev.	2.506	75	7	2017 yılında 3 Km.lik kesimin SK üzeri BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir. Muhtelif kesimlerde heyelan önleme çalışmalarına devam edilmektedir.	
5	Ulaştırma	1993E040860	Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr.	Denizli-Manisa	64.945	5.650	4.370	Dev.	0	0	9	BY-SK olarak tamamlanan ve Denizli ilindeki uzunluğu 34 Km olan yolun 12.04.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanmıştır.	
			SEHİR GEÇİSLERİ										
6	Ulaştırma	1986E040360	Çivril Çevre Yolu	Denizli	9.694	3.393	2.557	Dev.	2.557	100	61	2017 yılında 4 Km SK üzeri BSK tamamlanması hedeflenmiştir.	
7	Ulaştırma		Çal Geçşi	Denizli	12.382	2	2	Başl.	0	0	0	2017 yılında yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	
			İL YOLLARI YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER										
8	Ulaştırma	1964E042100	(Nazilli-Horsunlu)Ayr.-Karacasu-Tavas	Denizli-Aydın	23.324	10.615	768	Dev.	0	0	46	2017 yılında 3,1 Km.lik kesimin BY- SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.	
9	Ulaştırma		(Acıpayam-13.Bl.Hd.)Ayr.-Çameli-13.Bl. Hd.	Denizli	101.411	28.793	12.160	Dev.	4.475	37	33	2017 yılında 6 Km TY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 6,3 Km.lik kesimi TY-BSK, 1,5 km.lik kesimi TY.SK olarak tamamlanmıştır.	
			İL YOLLARI ONARIMI DEVAM EDEN İŞLER										
10	Ulaştırma	1986E040380	Çal-Bekilli	Denizli	9.108	4.074	2	Dev.	0	0	45	Akkent ve Hançalar geçişinde kamulaştırma problemlerinin çözülmesi halinde toprak tesfiye, sanat yapıları ve üstyapıda çalışılacaktır.	
11	Ulaştırma		(Denizli-Çivril)Ayr.-Çal	Denizli	6.533	2.987	2	Başl.	0	0	46	2017 yılında yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	
12	Ulaştırma		Ulubey-Güney	Denizli-Uşak	4.164	918	46	Dev.	0	0	22	Toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılacaktır.	
13	Ulaştırma		Ayr.-Buldan (Buldan Girişi)	Denizli	5.789	12	2	Dev.	0	0	0	Salihli- Alaşehir- Buldan(Aydın- Denizli)Ayr. BSK yapım işi kapsamında SK üzeri BSK yapılıması hedeflenmektedir.	
14	Ulaştırma		(Acıpayam-13. Bl. Hd.)Ayr.-Kelekçi	Denizli	9.304	12	2	Başl.	0	0	0	2017 yılında yolda bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	
			YENİ İŞLER										
15	Ulaştırma		Çivril- Işıklı- 3.Bl.Hd.- Dinar	Denizli	41.060		2	Başl.				0	2017 yılında TY-BSK olarak ihale edilecek olup, keşif çalışmaları devam ediyor.
			TURİZM ALANI VE MERKEZİ YOLLARI DEVAM EDEN İŞLER										
16	Turizm	2005F000130	Sarayköy-Akköy-Pamukkale-(Denizli-Çardak)Ayr.	Denizli	10.720	6.780	950	Dev.	0	0	63	10 km.lik (Denizli-Çardak)Ayr.-Pamukkale arası BY-BSK olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 6 km.lik Pamukkale-Akköy arasının 01.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlanılmıştır.	



KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ : DENİZLİ
YIL : 2017
YATIRIMCI DAİRE : KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

(1000 ₺)

SIRA NO	SEKTÖRÜ ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	PROJE DURUMU	DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR			
									NAKİT HARCAMA	%GERÇEKLEŞME					
										NAKİT	FİZİKİ				
17	Ulaştırma	1983E040290	KÖPRÜ YAPIMI YENİ İŞLER (Uşak- Afyon)Ayr.- Uşak- Çivril- Denizli Yolu KURUÇAY,BÜYÜKMENDERES KÖP.	Denizli-Uşak	1.200			4	Başl.	0	0	0	2017 yılında ihale edilmesi planlanmıştır.		
18	Ulaştırma	2001E040110	KÖPRÜ ONARIMI - Muhtelif Köprü Onarımları	Denizli	2.062	1.041	364	Dev.		0	0	0	29.05.2017 tarihinde muhtelif köprülerde onarım yapılması işi ihale edilmiş olup, çalışmalara 50 başlanılmıştır.		
19	Ulaştırma	2000E040020	TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI YENİ İŞLER Denizli İli, Kale İlçesinde TABAE (Eski Kale)KÖPRÜSÜ	Denizli	200			20	Başl.	0	0	0	0	Restorasyon projesi hazırlanacaktır.	
TOPLAM						1.007.618	315.556	75.606			57.995		37		
Bakım, Trafik, Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar					Denizli										
GENEL TOPLAM						1.007.618	315.556	75.606			57.995	77	37		

Ayrıca Denizli İlinde, Bakım, Trafik, Kamulaştırma çalışmaları ve diğer hizmetler için 6,3 Milyon TL. harcama yapılmıştır.



Sıra No	Sektörün Adı	Proje Numarası	PROJENİN ADI	Proje Yeri	Karak-teristik (KM)	İşin Baş.Bit. Tarihi	Proje Tutarı	Proj.Yılına Kadar Yap. Harcama	Yılı		Yılı Ödeneğinin Dönemlere Göre Dağılımı				İş birliği Yönün den İlgili Kuru.	Düşünceler
									Ödeneği	Revi.	1.Dön.	2.Dön.	3.Dön.	4.Dön.		
1	Ulaştırma		DEVLET YOLLARI YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI Denizli-Çardak-13.Bl.Hd.	Denizli	59	1997-2020	200.297	153.719	2.570		514	771	1.028	257	2017 yılında ikmal ihalesi yapılarak köprülü kavşak ve üstgeçitlerde çalışılacaktır.	
2	Ulaştırma	1977EO40390	BÖLÜNMÜŞ YOLLAR Denizli-Acıpayam-13.Bölge Hududu	Denizli	78	1997-2020	204.511	81.772	2.570		514	771	1.028	257	2017 yılında 9 Km.lik kesimin SK>BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.	
3	Ulaştırma	2010EO40210	(Denizli-Çardak)Ayr.-Sivaslı-Uşak	Denizli	109	2010-2020	140.244	6.330	874		175	262	350	87	2017 yılında 8,1 km BY-BSK ve 4,5 km SK>BSK tamamlanması hedeflenmiştir.	
4	Ulaştırma	2006EO40440	(Denizli-Acıpayam)Ayr.-Kale-Muğla İl.Sn.	Denizli	41	2006-2020	160.670	9.458	3.328		666	998	1.331	333	2017 yılında 3 Km.lik kesimin SK>BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.	
5	Ulaştırma	1993EO40860	Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr.	Denizli	79	2003-2020	64.945	5.650	4.370		874	1.311	1.748	437	BY-SK olarak tamamlanan ve denizli ilindeki uzunluğu 34 km olan yolun 20.03.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, süreç devam etmektedir.	
6	Ulaştırma	1986EO40360	SEHİR GEÇİSLERİ DEVAM EDEN İŞLER Çivril Çevre Yolu	Denizli	8	2005-2018	9.694	3.393	2		0	1	1	0	2017 yılında 4 km SK>BSK tamamlanması hedeflenmiştir.	
7	Ulaştırma		Çal Geçişi İL YOLLARI YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER	Denizli	4,5	2016-2020	12.382	2	2		0	1	1	0	Yol bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	
8	Ulaştırma	1964EO42100	(Nazilli-Horsunlu)Ayr.-Karacasu-Tavas	Denizli	70	2005-2019	23.324	10.615	768		154	230	1	77	2017 yılında 3,1 km.lik kesimin BY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.	
9	Ulaştırma		(Acıpayam-13.Bl.Hd.)Ayr.-Çameli-13.Bl. Hd.	Denizli	83	2005-2019	101.411	28.793	12.160		2.432	3.648	4.864	1.216	2017 yılında 6 Km. TY-BSK Yapılması hedeflenmektedir.	
10	Ulaştırma	1986EO40380	İL YOLLARI ONARIMI DEVAM EDEN İŞLER Çal-Bekilli	Denizli	19	1998-2018	9.108	4.074	2		0	2	2	0	Akkent ve Hançalar geçişinde kamulaştırma problemlerinin çözülmesi halinde toprak tesfiye, sanat yapıları ve üstyapıda çalışılacaktır.	
11	Ulaştırma		(Denizli-Çivril)Ayr.-Çal	Denizli	22	1998-2018	6.533	2.987	2		0	1	1	0	Yol bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	
12	Ulaştırma		Ulubey-Güney	Denizli	43	2004-2018	4.164	918	46		9	14	18	5	Toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılacaktır.	
13	Ulaştırma		Ayr.-Buldan (Buldan Girişi)	Denizli	3	2012-2018	5.789	12	2		0	1	1	0	Salihli- Alaşehir- Buldan(Aydın- Denizli)Ayr. BSK yapım işi kapsamında SK üzeri BSK yapılması hedeflenmektedir.	
14	Ulaştırma		(Acıpayam-13. Bl. Hd.)Ayr.-Kelekçi	Denizli	22	2012-2018	9.304	12	2		0	1	1	0	Yol bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	
15	Ulaştırma		YENİ İŞLER Çivril-İşikli-3. Bl. Hd.-Dinar	Denizli	58	2017-2020	41.060		2		0	1	1	0	Yol bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.	
16	Turizm	2005F000130	TURİZM ALANI VE MERKEZİ YOLLARI DEVAM EDEN İŞLER Sarayköy-Akköy-Pamukkale-(Denizli-Çardak)Ayr.	Denizli	41	2005-2018	10.720	6.780	950		190	285	380	95	10 Km.lik (Denizli-Çardak)Ayr.-Pamukkale kesimi BY-BSK olarak tamamlanmıştır. Pamuk-kale-Akköy arası ise 01.12.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılacaktır.	
17	Ulaştırma	1983EO40290	KÖPRÜ YAPIMI YENİ İŞLER (Uşak-Afyon)Ayr.-Uşak-Çivril-Denizli Yolunda KURUÇAY, BÜYÜKMENDERES Köp.	Denizli	34, 53	2017-2020	1.200	0	4		1	1	2	0	2017 yılında ihale edilmesi planlanmıştır.	
18	Ulaştırma	2001EO40110	KÖPRÜ ONARIMI Muhtelif Köprü Onarımları	Denizli		2011-2018	2.062	1041	364		73	109	146	36	Muhtelif köprülerde onarım çalışmalarına devam edilecektir.	
19	Ulaştırma	2000EO40020	TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI YENİ İŞLER Denizli İli, Kale İlçesinde TABAE(Eski Kale) KÖPRÜSÜ	Denizli	30	2017-2020	200	0	20		4	6	8	2	Restorasyon projesi hazırlanacaktır.	
TOPLAM							1.007.618	315.556	28.038	0	5.607	8.413	10.910	2.803		

